



PAPREC

COMMISSION PAYSAGE

ISDND COVED LES GRANGES-GONTARDES

04/06/2025

ORDRE DU JOUR

- **Point de démarrage de LCJ3**
- **Point sur les travaux paysagers de LCJ3**
- **Point d'avancement sur les travaux de fermeture de Roussas 2**
- **Questions diverses**



01

**Point de démarrage de
LCJ3**

Ouverture de LCJ3



DEMARRAGE LCJ3

- Ouverture du site le 02/01/2025 à 6h00
- Environ 25 kT réceptionnées à fin Mai 2025
- Une inspection DREAL le 06/05/2025
- Un AP en mars 2025 pour la suppression d'un moteur biogaz




Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne Rhône Alpes
Unité interdépartementale Drôme Ardèche

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N° 20250124-DEC-DAEN0087
EN DATE DU **26 MARS 2025**

PORTANT SUR LA MISE À JOUR DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE
L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX EXPLOITÉE AUX
GRANGES GONTARDES AU LIEU-DIT « BOIS DES MATTES » PAR LA SOCIÉTÉ COVED

Le préfet de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

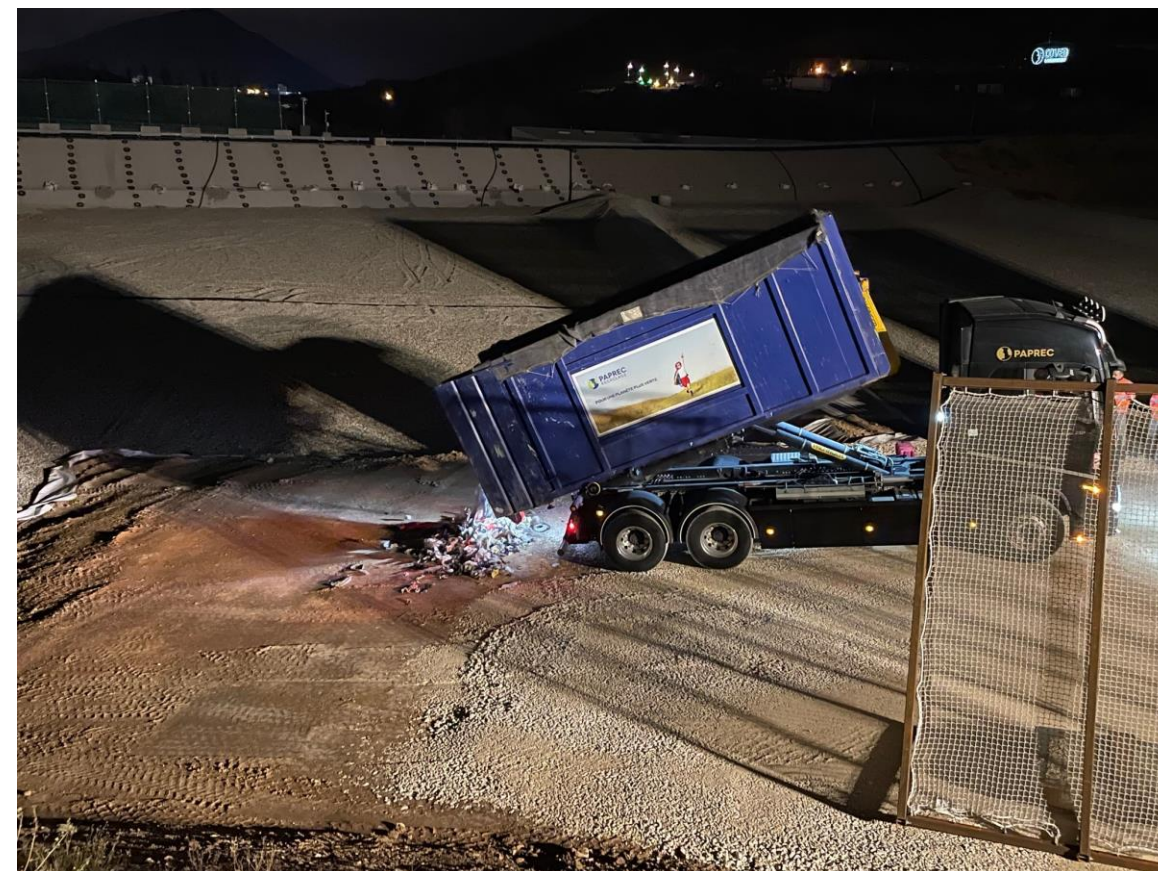

- ***Fermeture définitive de Roussas 2 au 31/12/2024. 93 617 T réceptionnées en 2024.***

DEMARRAGE LCJ3

- Dispositif de filets anti-envols opérationnels fin décembre 2024 (300 ml installés)
- Ajout de moyens mobiles sur le casier (cages et bennes filets)

Le dispositif a été éprouvé depuis ce début d'année et il est efficace



- *La prévention des envols et leur ramassage reste au cœur de nos préoccupations !*

DEMARRAGE LCJ3

- **Vigilance sur le sujet odeurs**

Quelques remarques ponctuelles remontées par des administrés de passage le long de la RD133

- ⇒ **Odeur lixiviats/déchets : produit neutralisant spécifique placé dans le bassin lixiviats ; odeurs déchets : travail en amont sur produit neutralisant**
- ⇒ **Odeur biogaz : Travaux de fermeture de Roussas 2 en cours (réseau de biogaz provisoire avec une partie déconnectée ponctuellement sur la zone de réaménagement en cours + forages complémentaires biogaz jusqu'au 06/06) ; sur LCJ3, le biogaz sera capté dès production à l'avancement idem Roussas 2**
- ⇒ **Une attention particulière sur ce point par nos équipes d'exploitation, avec notamment des rondes quotidiennes effectuées.**

02

**TRAVAUX PAYSAGERS
LCJ3**

TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

- Les travaux ont été terminés fin 2024 :
 - Plus de 1 200 plants installés sur les différentes zones
 - Système d'arrosage automatique sur l'ensemble des zones
 - Ré-utilisation des eaux pluviales de LCJ3 (complément possible avec Roussas 2)
 - Rappel de l'objectif : masquer l'exploitation depuis la circulation sur la RD133
- Un premier suivi de la végétation sera réalisé en Juin 2025
- Un second suivi sera réalisé à l'automne 2025 dans le cadre du parfait achèvement (remplacement des sujets morts)



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Vue du merlon paysager Mai 2024 et Mai 2025



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Travaux de plantation du merlon novembre 2024



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Vue des plantations du merlon paysager décembre 2024



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Vue des plantations du merlon paysager mars 2025



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Vue des plantations depuis l'entrée stand de tir novembre 2024



TRAVAUX PAYSAGERS LCJ3

Aménagement paysager de l'accueil Bascule au printemps 2024



TRAVAUX PAYSAGER LCJ3

Aménagement paysager de l'accueil bascule au printemps 2025



03

**POINT D'AVANCEMENT
TRAVAUX FERMETURE
ROUSSAS 2**

POINT D'AVANCEMENT TRAVAUX FERMETURE ROUSSAS 2

Pour rappel, quelques chiffres pour ces travaux :

- **62 000 m² de couverture**

- Etanchéité (géosynthétique bentonitique et géomembrane)
- Drainage des eaux pluviales (géosynthétique de drainage)
- Végétalisation pour l'intégration paysagère et la biodiversité à l'aide de terre végétale et mélange d'essences locales : ensemencement phase 1 prévu à partir du 03/06/25

- **Captage du biogaz et contrôle des émissions diffuses : 10 puits de captage complémentaires sur un réseau de 50 puits au total**

- **Fonctionnement en mode bioréacteur : 24 puits de réinjection de lixiviats complémentaires sur un réseau de 36 puits au total – Chiffrage en cours d'un dispositif de pilotage du bioréacteur**


- **Récupération des eaux pluviales : 3 km de fossés**

ASPECTS ADMINISTRATIFS DES TRAVAUX DE FERMETURE

- **Dossier technique de fermeture à valider DREAL avant passage en suivi post-exploitation et arrêté préfectoral de suivi**
 - Profil du réaménagement
 - Epaisseurs de matériaux de couverture
 - Etanchéité géomembrane
 - Gestion des eaux pluviales
 - Intégration paysagère
- **Dossier de servitudes d'utilité publique et arrêté préfectoral de SUP**
 - Sur l'emprise du casier et sur une bande de 200 m autour du casier
 - Objectif : interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle, hormis typiquement la mise en place de panneaux solaires si ultérieurement compatibles après la période de tassement, assurer la protection des ouvrages de captage du biogaz et des eaux et maintenir le confinement des déchets.


LE SUIVI POST-EXPLOITATION UNE FOIS LE CASIER REFERME

- **Surveillance environnementale pendant une période initiale de 20 ans**
 - Qualité des eaux de circulation souterraines, le site étant cependant hors des périmètres de captage des eaux destinées à la production d'eau potable
 - Qualité des eaux de drainage de la couverture
 - Surveillance des tassements
 - Récupération des biogaz qui sont produits, valorisation énergétique et limitation des émissions diffuses
 - Intégration paysagère et biodiversité

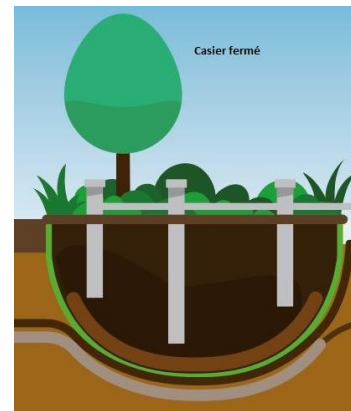

=> Objectif : inertage des déchets ; passé la période de surveillance, les déchets deviennent inertes, c'est-à-dire qu'ils n'émettent plus de rejets ni gazeux, ni liquides.

LES TRAVAUX DE FERMETURE DE ROUSSAS 2

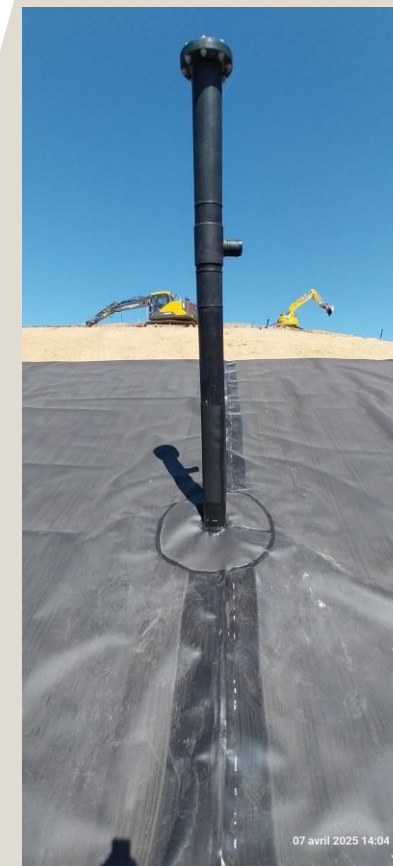

LES TRAVAUX DE FERMETURE DE ROUSSAS 2

**Vue du casier en cours
de fermeture
au 04 Juin 2025**



LES TRAVAUX DE FERMETURE DE ROUSSAS 2

**Vue du casier en cours
de fermeture
au 04 Juin 2025**



04

QUESTIONS DIVERSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
